

CARNET DE PHASAGE TRAVAUX

PROJET DE MODERNISATION ET RECONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES (35)

CHU Rennes

Juin 2020



Légende



Travaux de démolition



Travaux de construction



Emprise de chantier



Travaux de restructuration



Voie réservée logistique de chantier



Bâtiments ciblés par la demande de dérogation





Clémenceau



Centre Chirurgical et Interventionnel

Bâtiment Tertiaire

Terrain vierge
Base logistique
chantier avancée

Faits marquants

- Démolition du bâtiment Clémenceau
- Travaux préparatoires Centre Chirurgical et Interventionnel
- Construction du Bâtiment Tertiaire

2020



Parking P4

Centre Chirurgical et Interventionnel

Galerie logistique enterrée


Plateforme Logistique

Terrain vierge
Base logistique
chantier avancée

Faits marquants

- Réception du bâtiment Tertiaire
- **Construction du Centre Chirurgical et Interventionnel**
- Travaux préparatoires du Pôle Femme-Mère-Enfant
- Construction de la Plateforme Logistique et la galerie enterrée
- Construction du Parking silo et activités mixtes


2021

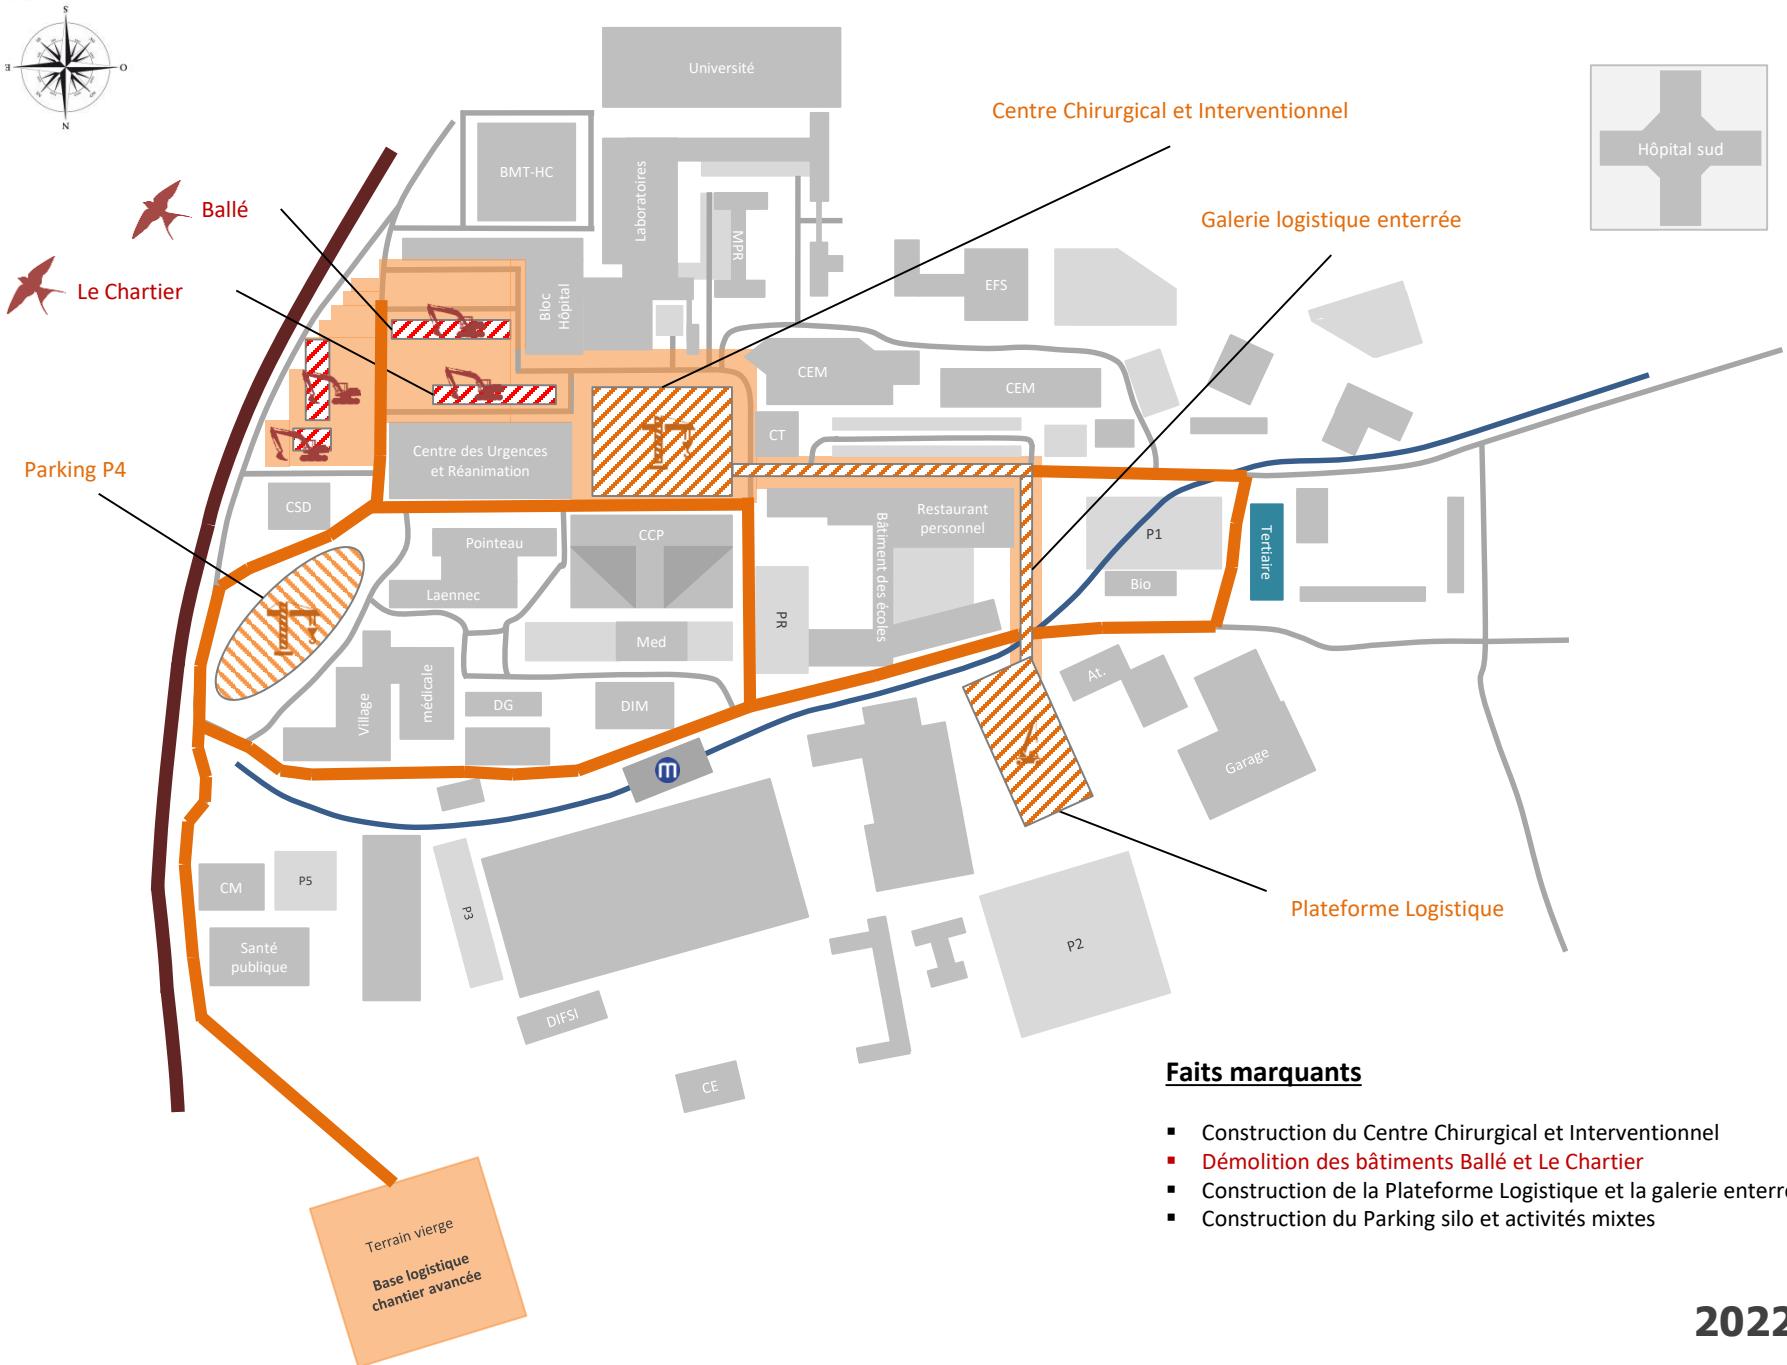

Faits marquants

- Construction du Centre Chirurgical et Interventionnel
- Démolition des bâtiments Ballé et Le Chartier
- Construction de la Plateforme Logistique et la galerie enterrée
- Construction du Parking silo et activités mixtes

Terrain vierge
Base logistique
chantier avancée

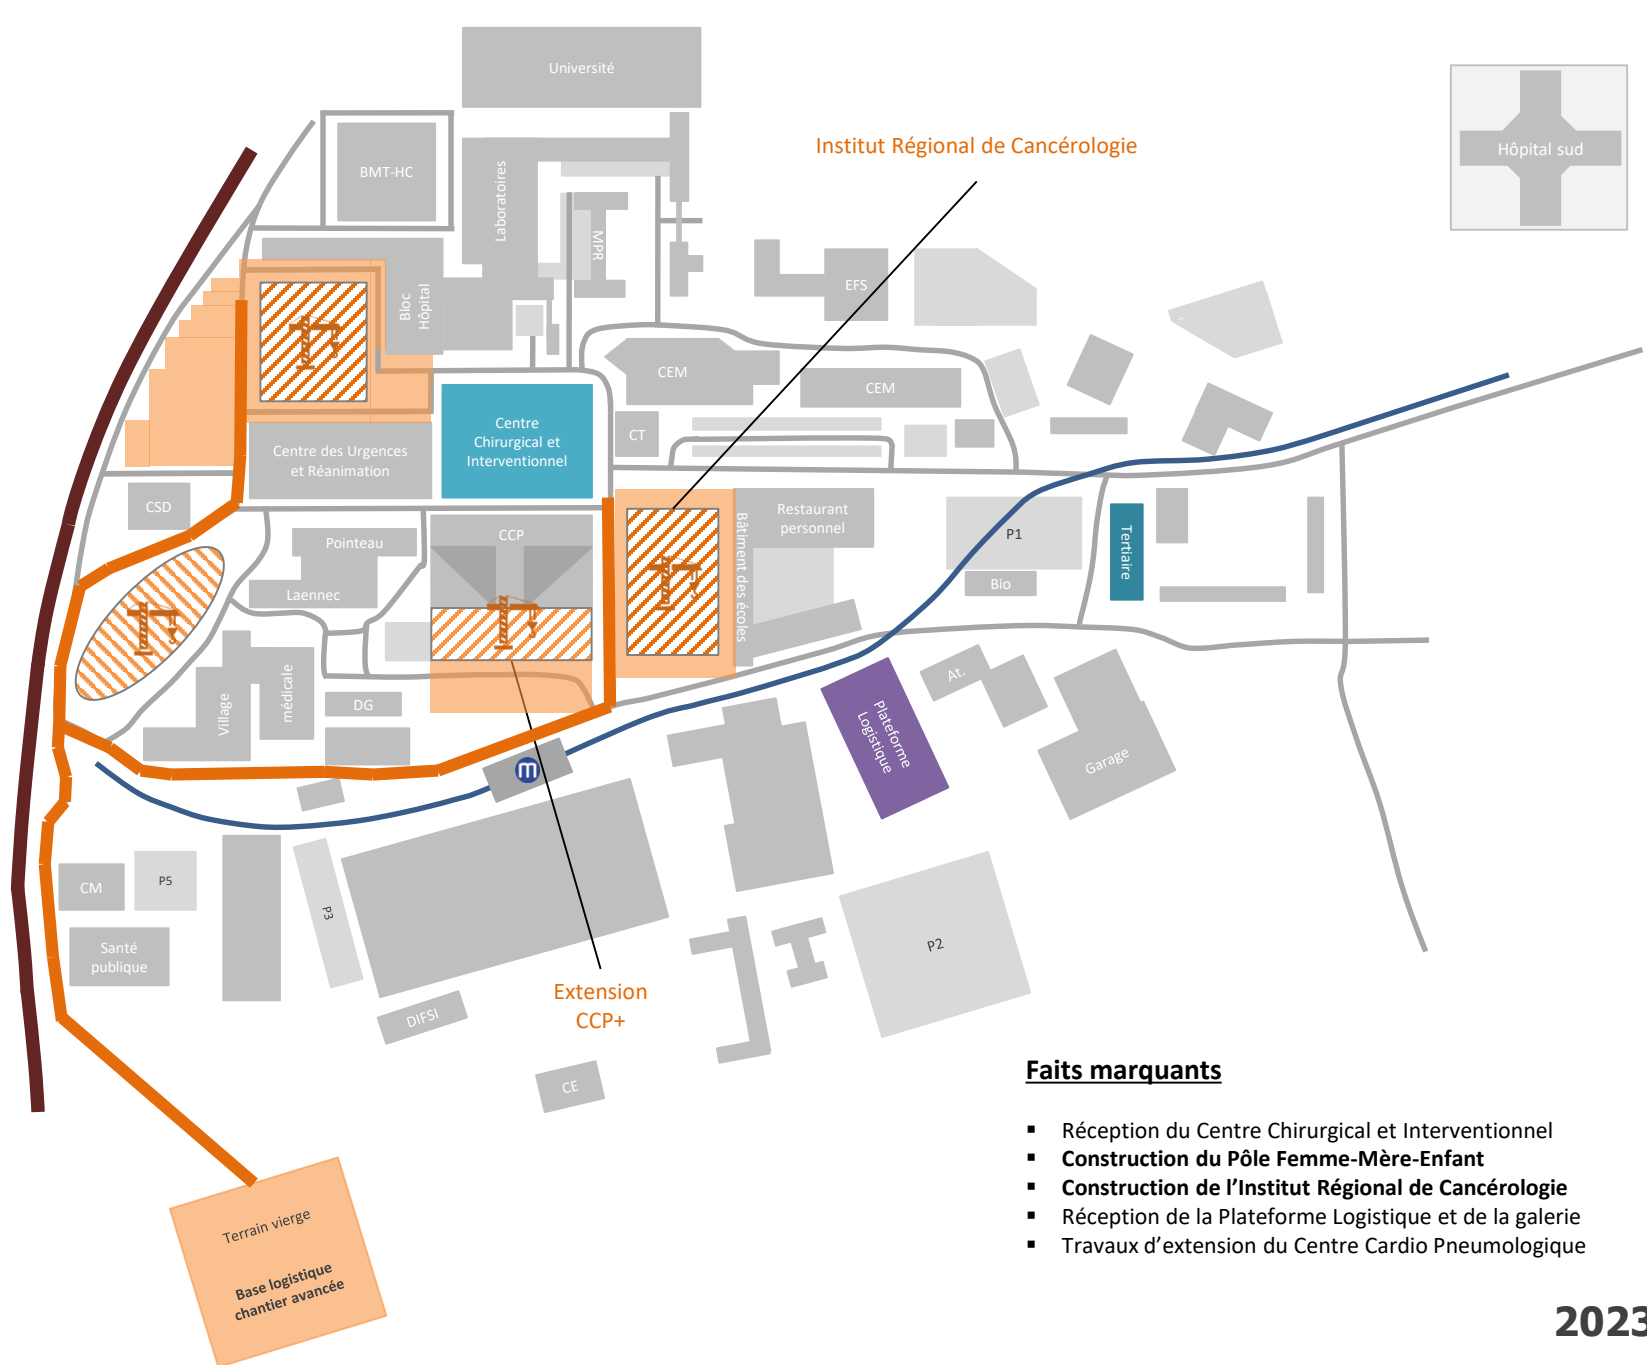


Faits marquants

- R ception du Centre Chirurgical et Interventionnel
- **Construction du P le Femme-M re-Enfant**
- **Construction de l'Institut R gional de Canc rologie**
- R ception de la Plateforme Logistique et de la galerie
- Travaux d'extension du Centre Cardio Pneumologique



Centre des Urgences
et Réanimations


Centre Cardio Pneumologie

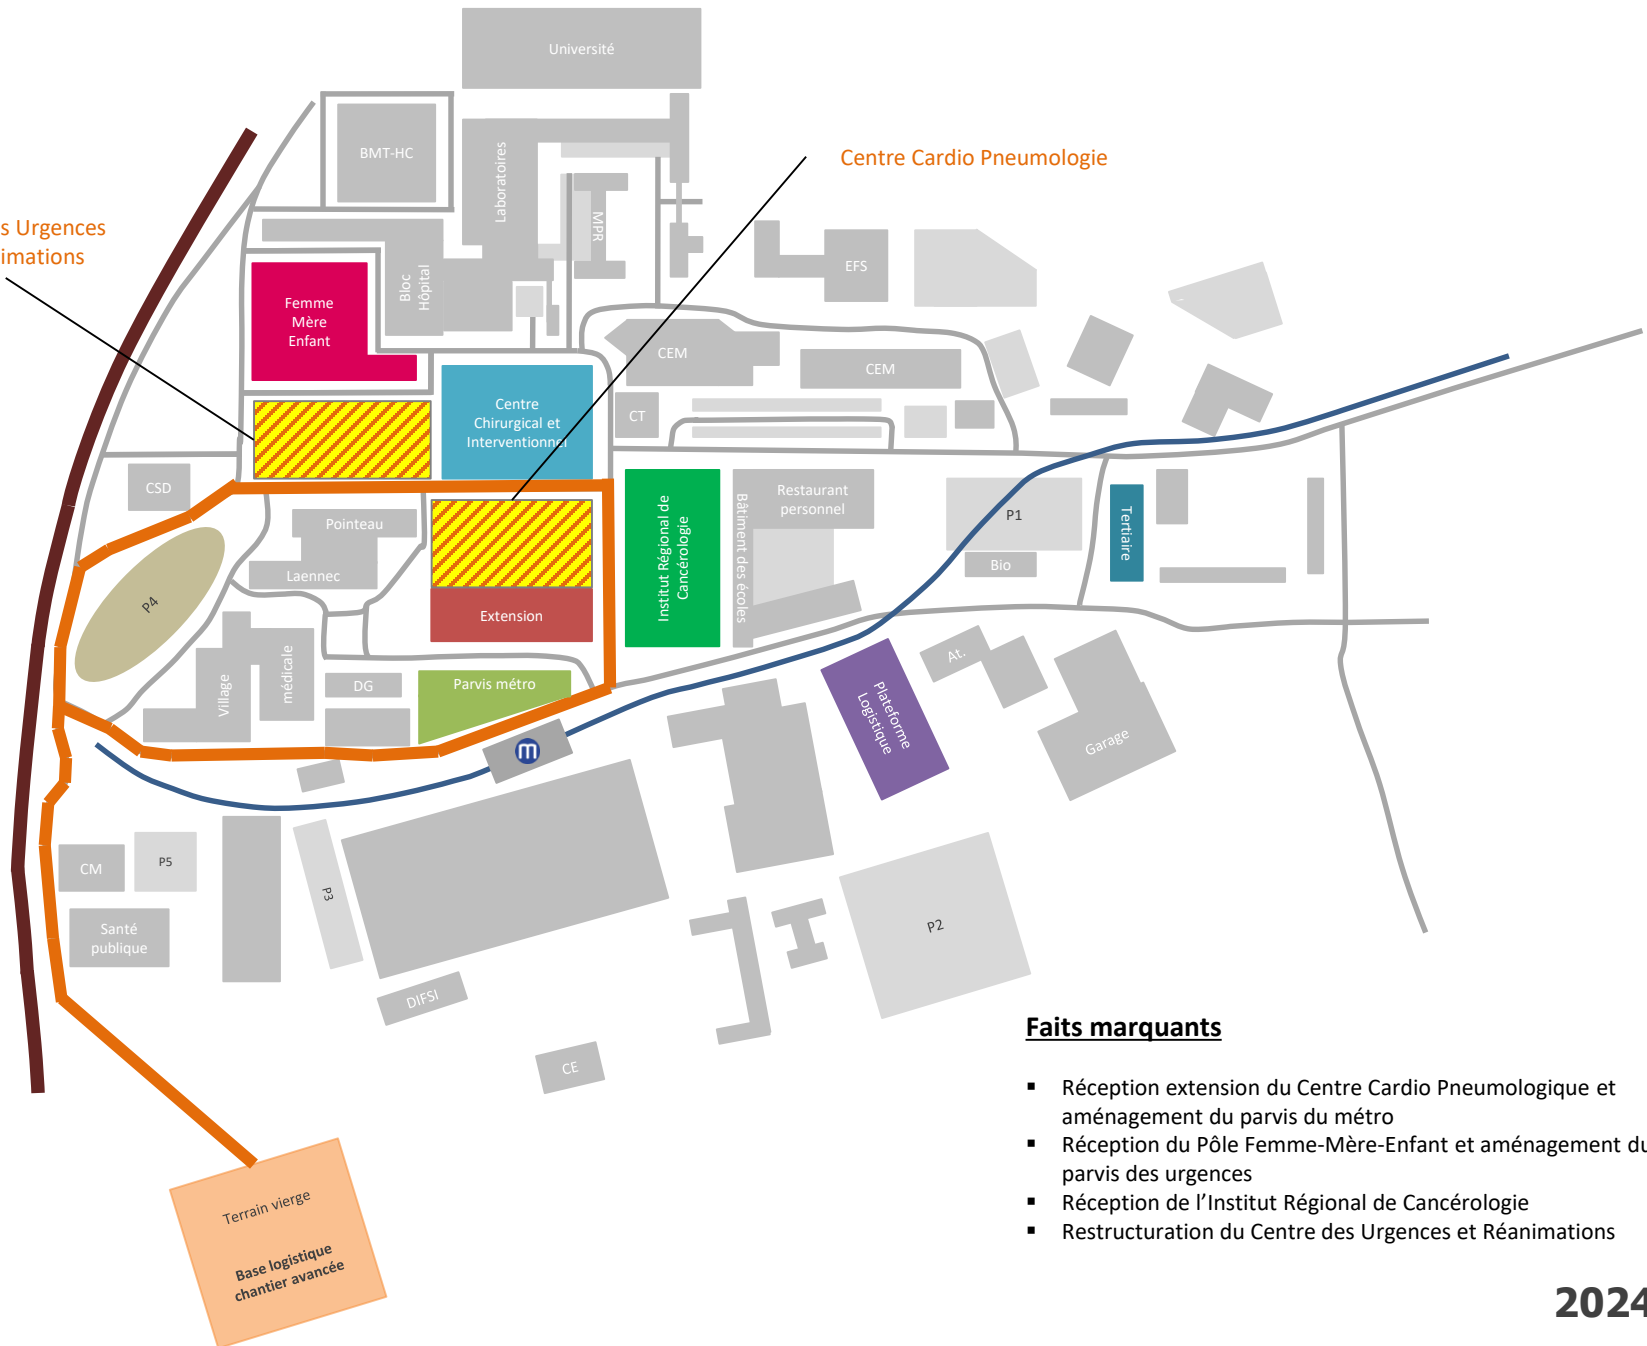

Faits marquants


- Réception extension du Centre Cardio Pneumologie et aménagement du parvis du métro
- Réception du Pôle Femme-Mère-Enfant et aménagement du parvis des urgences
- Réception de l'Institut Régional de Cancérologie
- Restructuration du Centre des Urgences et Réanimations

2024

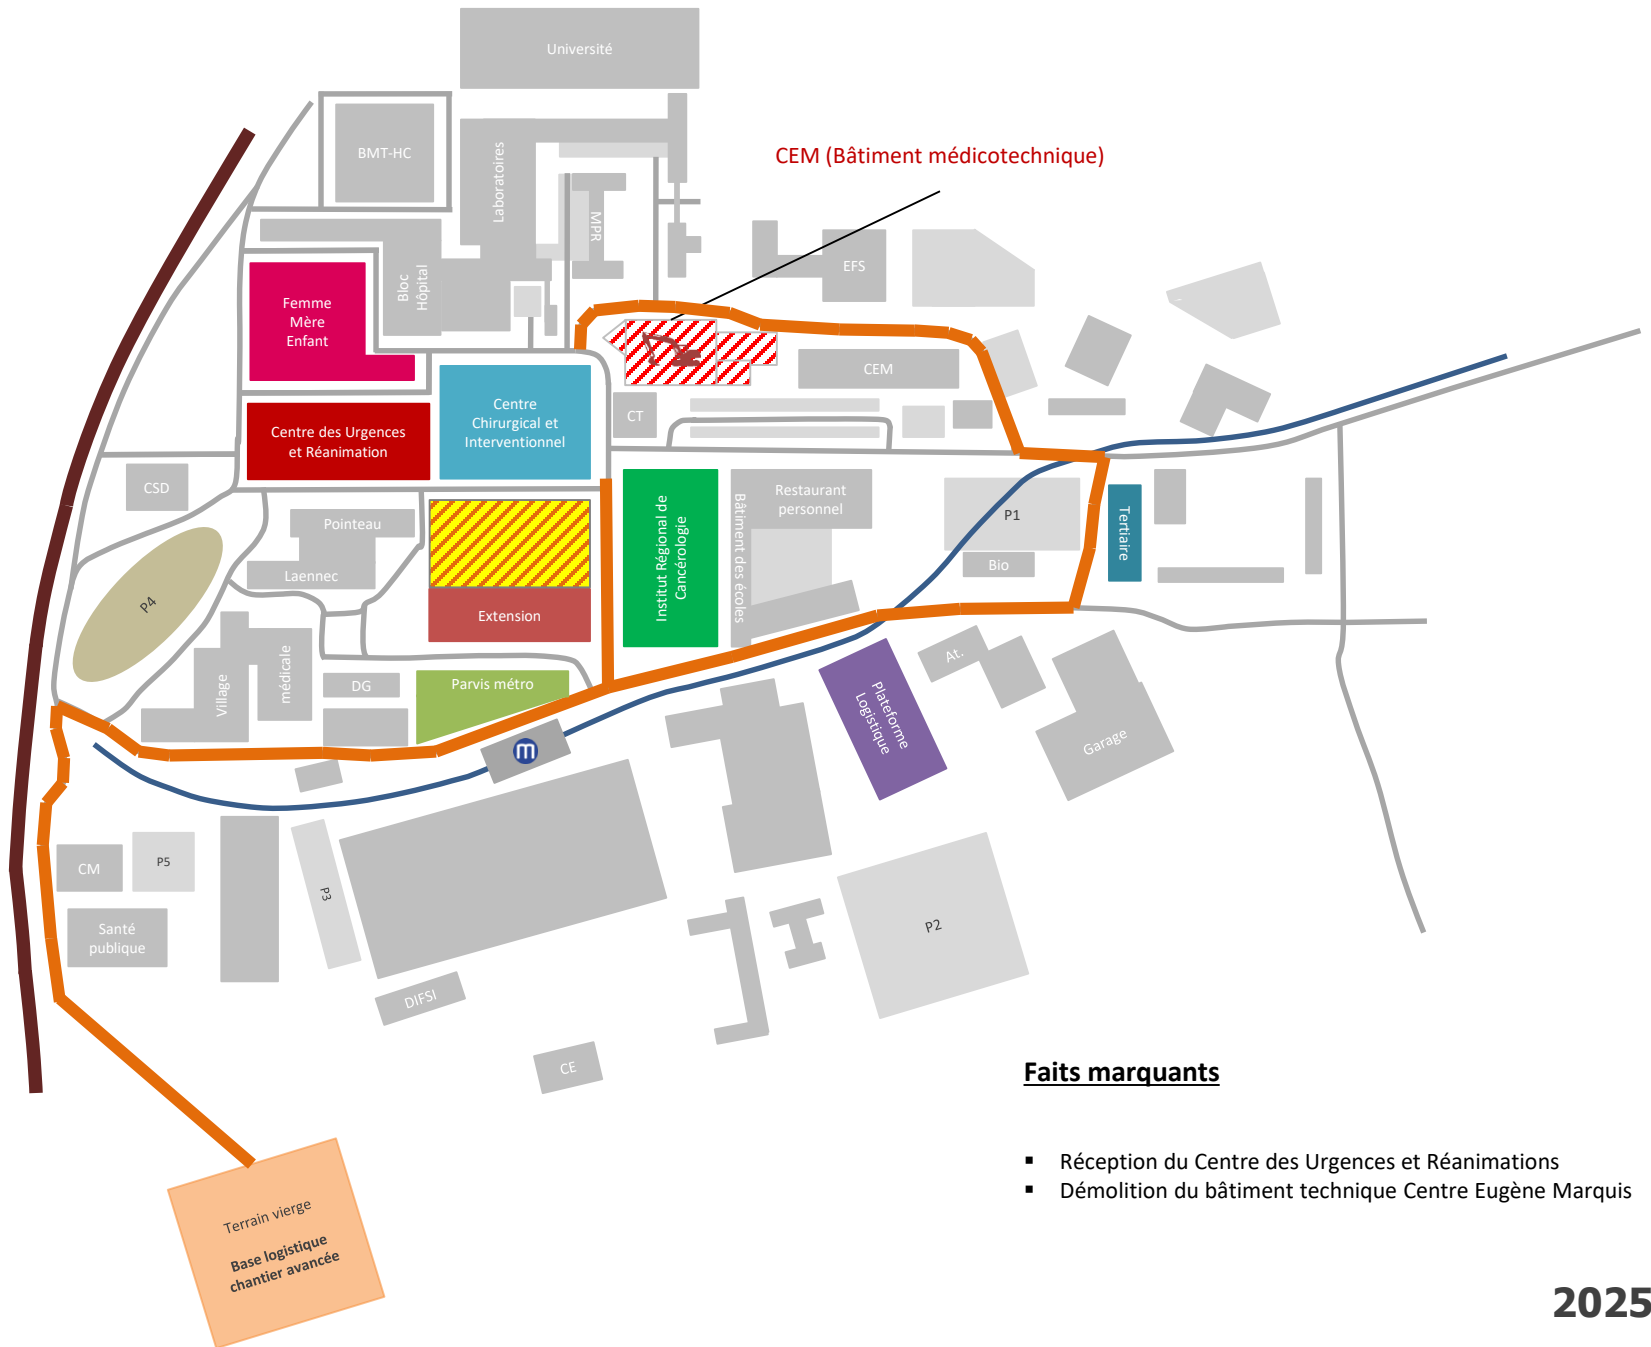


Faits marquants

- Réception du Centre des Urgences et Réanimations
- Démolition du bâtiment technique Centre Eugène Marquis

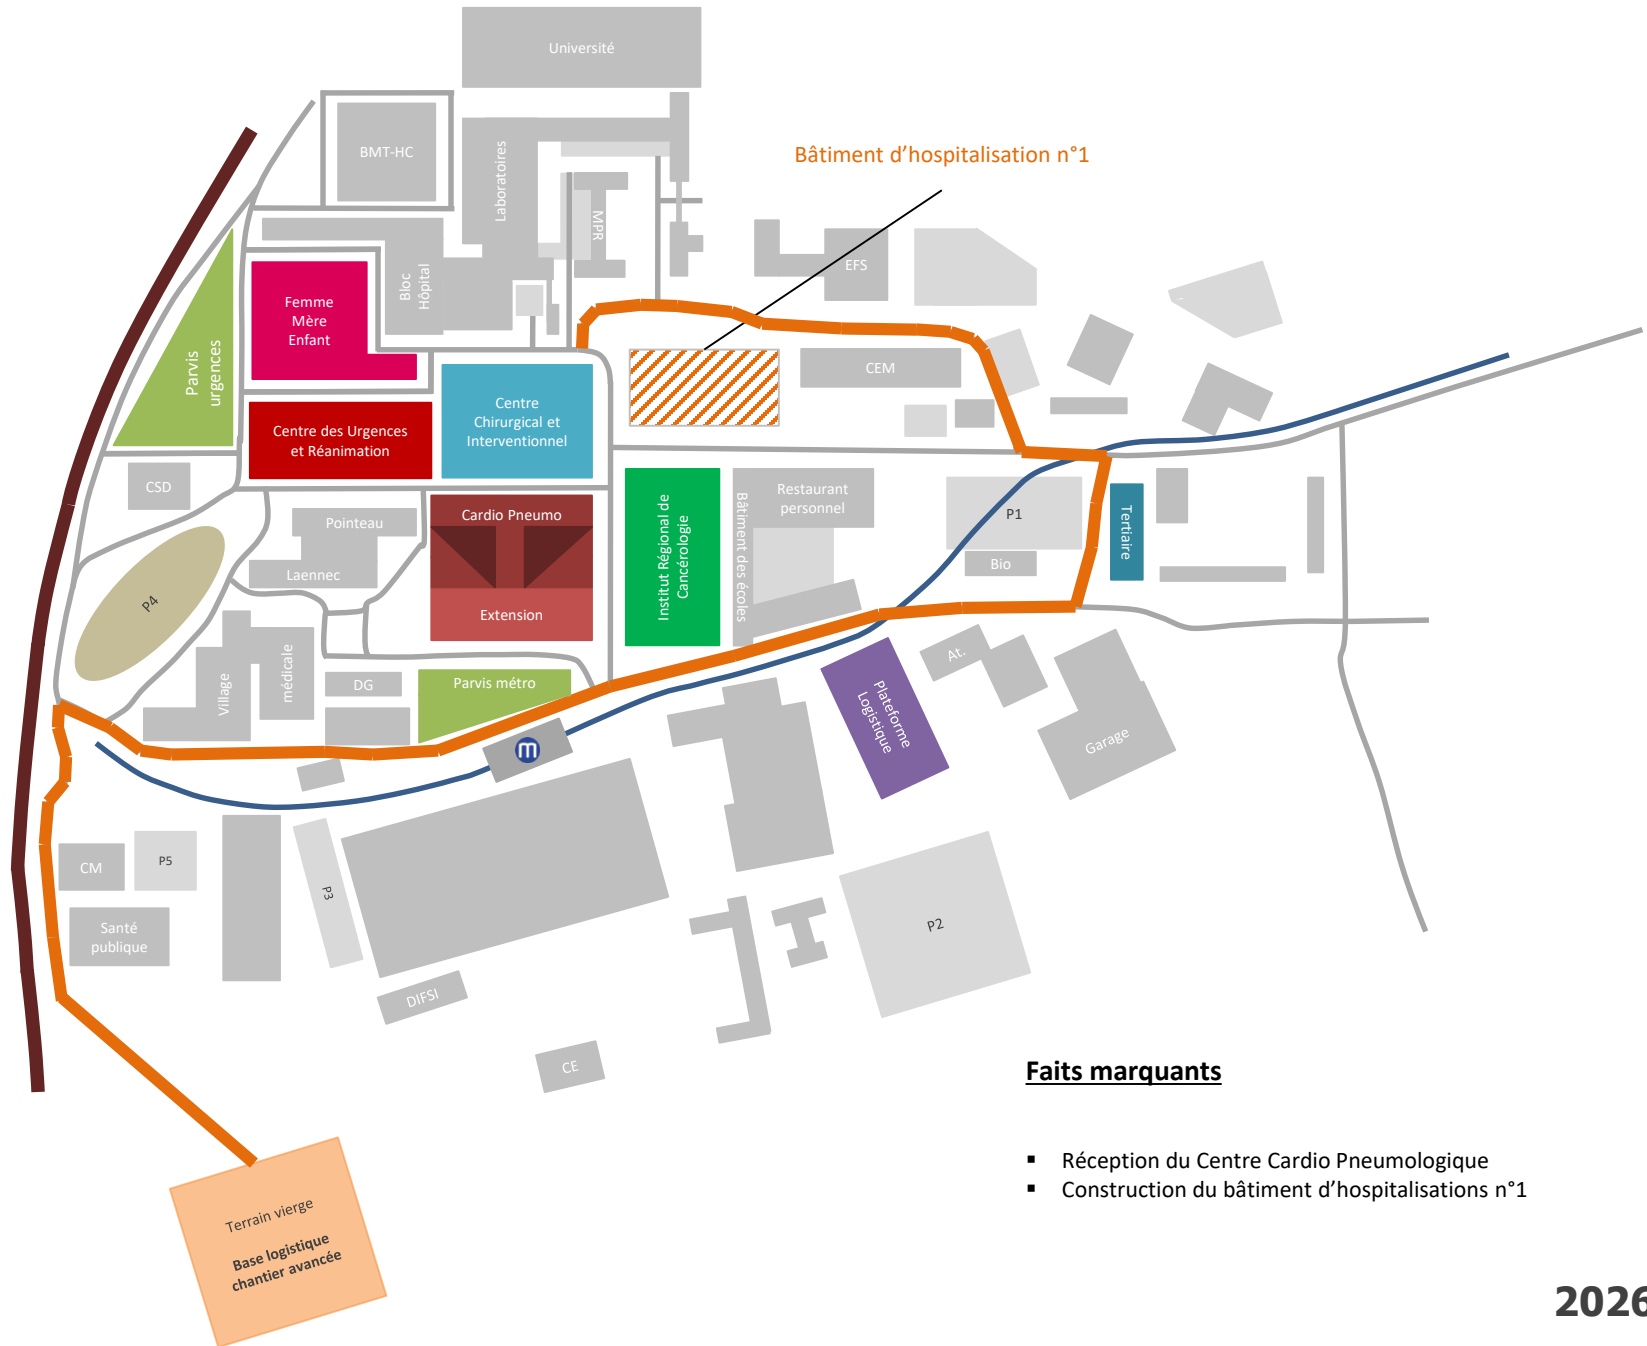

Faits marquants

- Réception du Centre Cardio Pneumologique
- Construction du bâtiment d'hospitalisations n°1

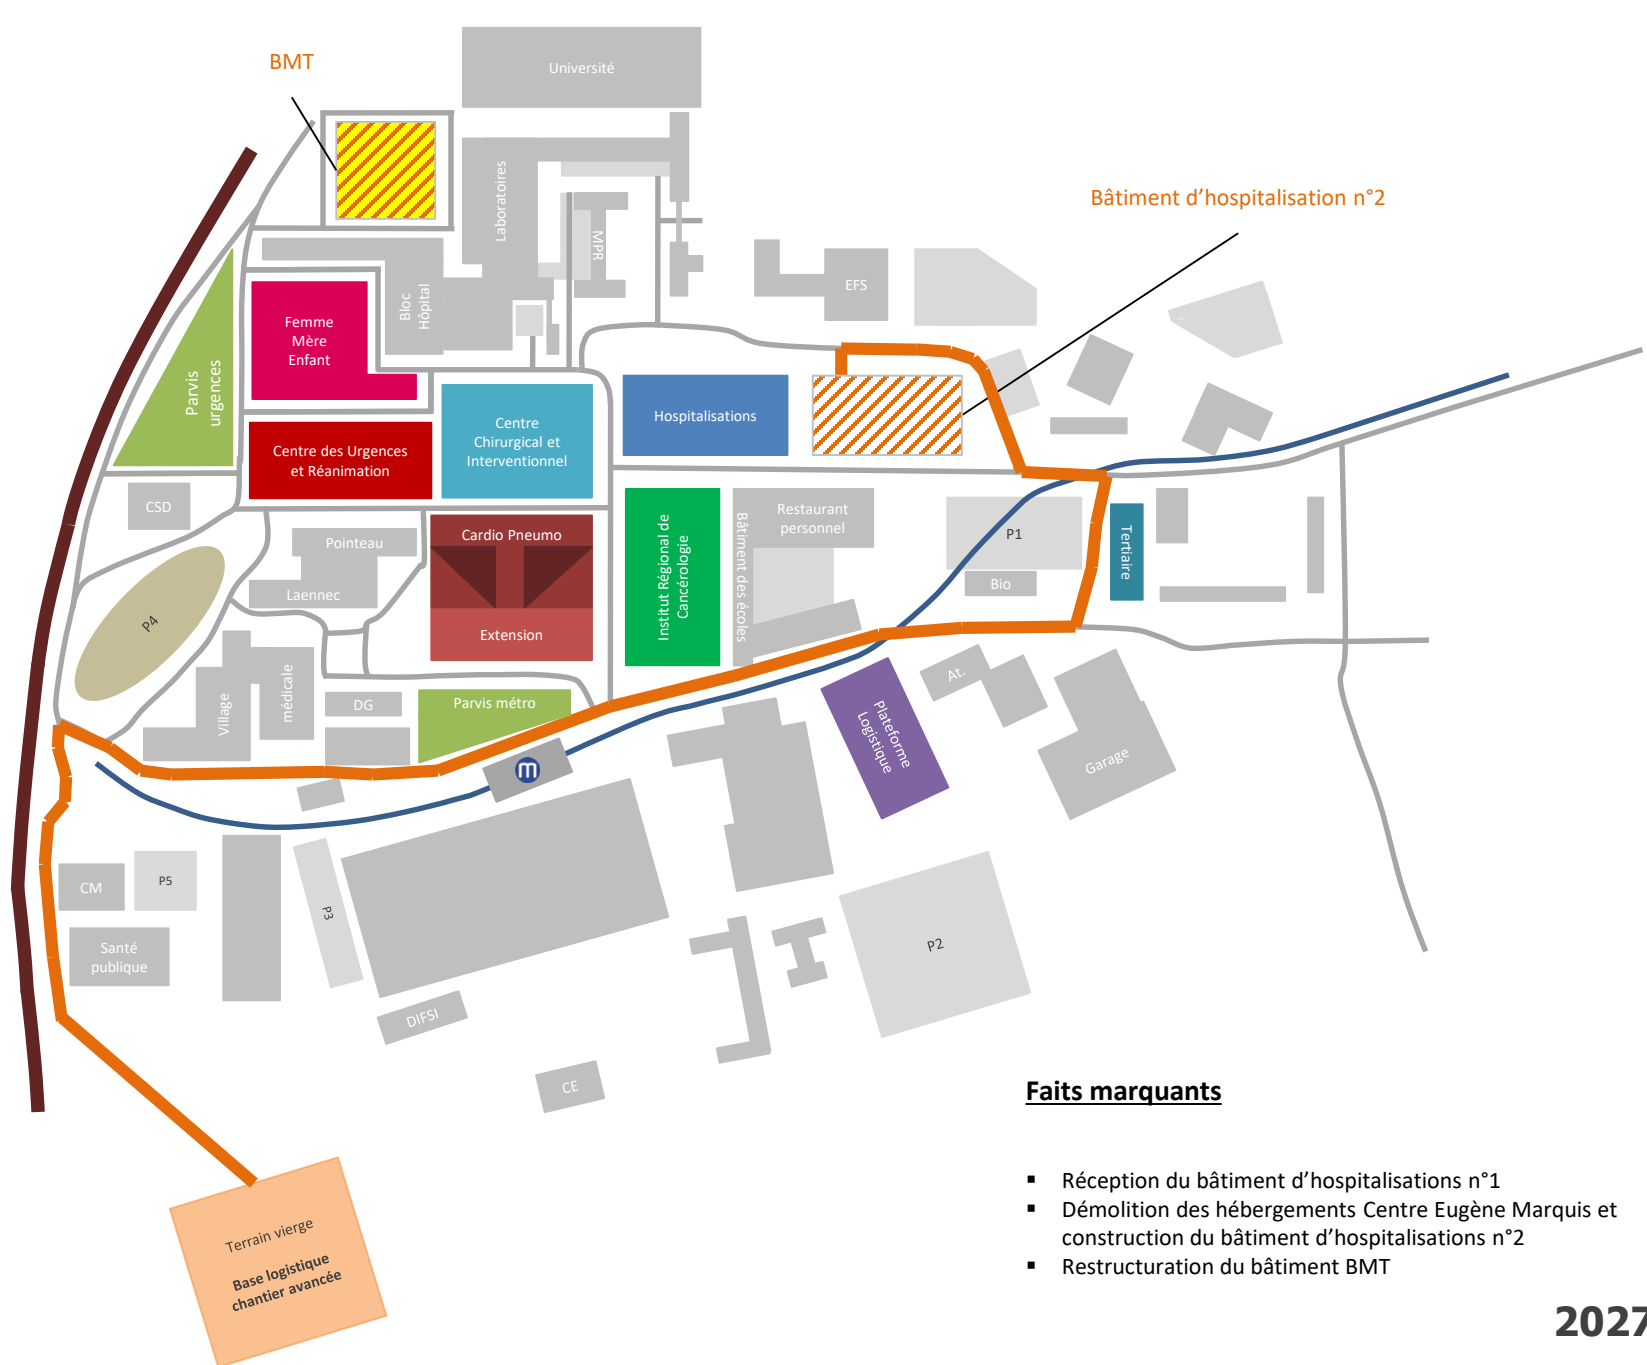


Faits marquants

- Réception du bâtiment d'hospitalisations n°1
- Démolition des hébergements Centre Eugène Marquis et construction du bâtiment d'hospitalisations n°2
- Restructuration du bâtiment BMT




Pointeau-Laennec

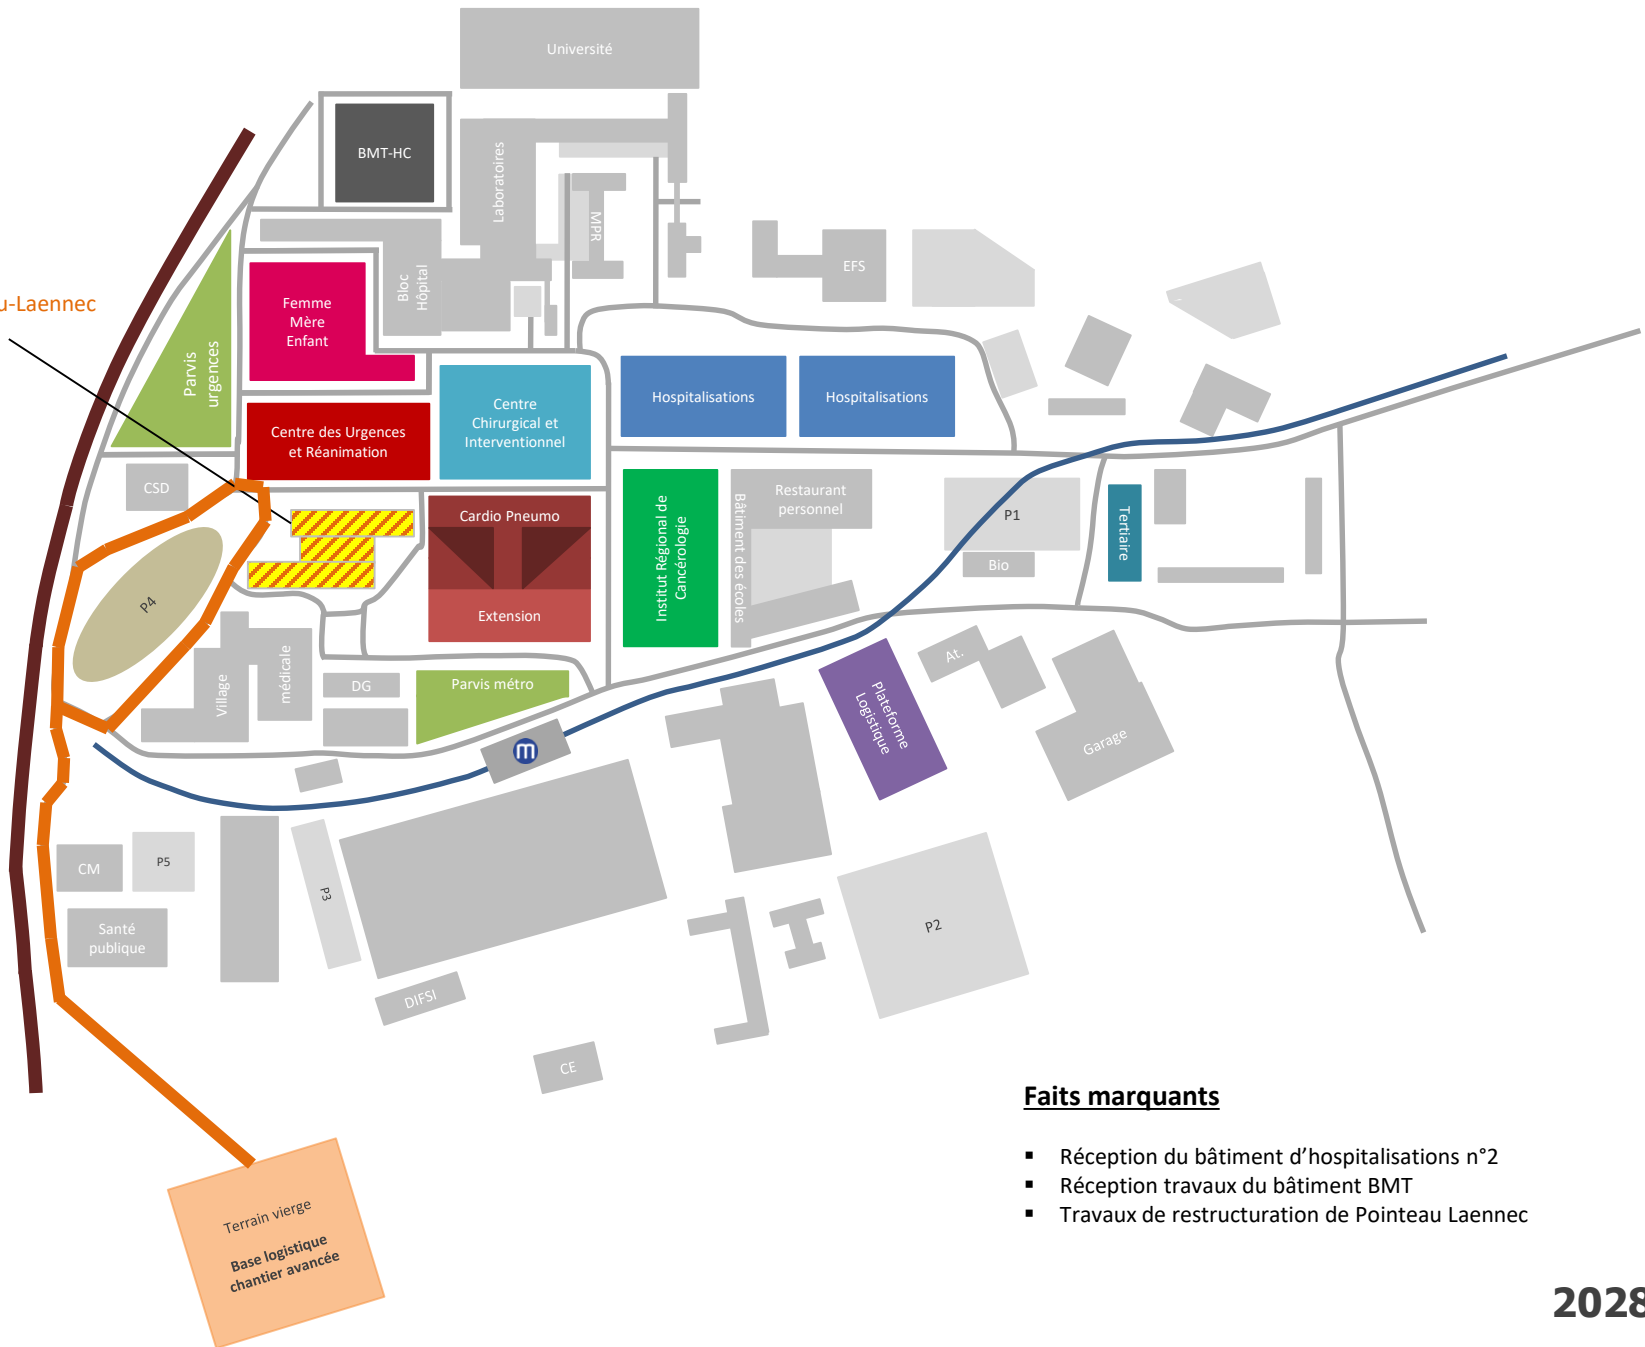

Faits marquants

- R ception du b timent d'hospitalisations n 2
- R ception travaux du b timent BMT
- Travaux de restructuration de Pointeau Laennec

2028

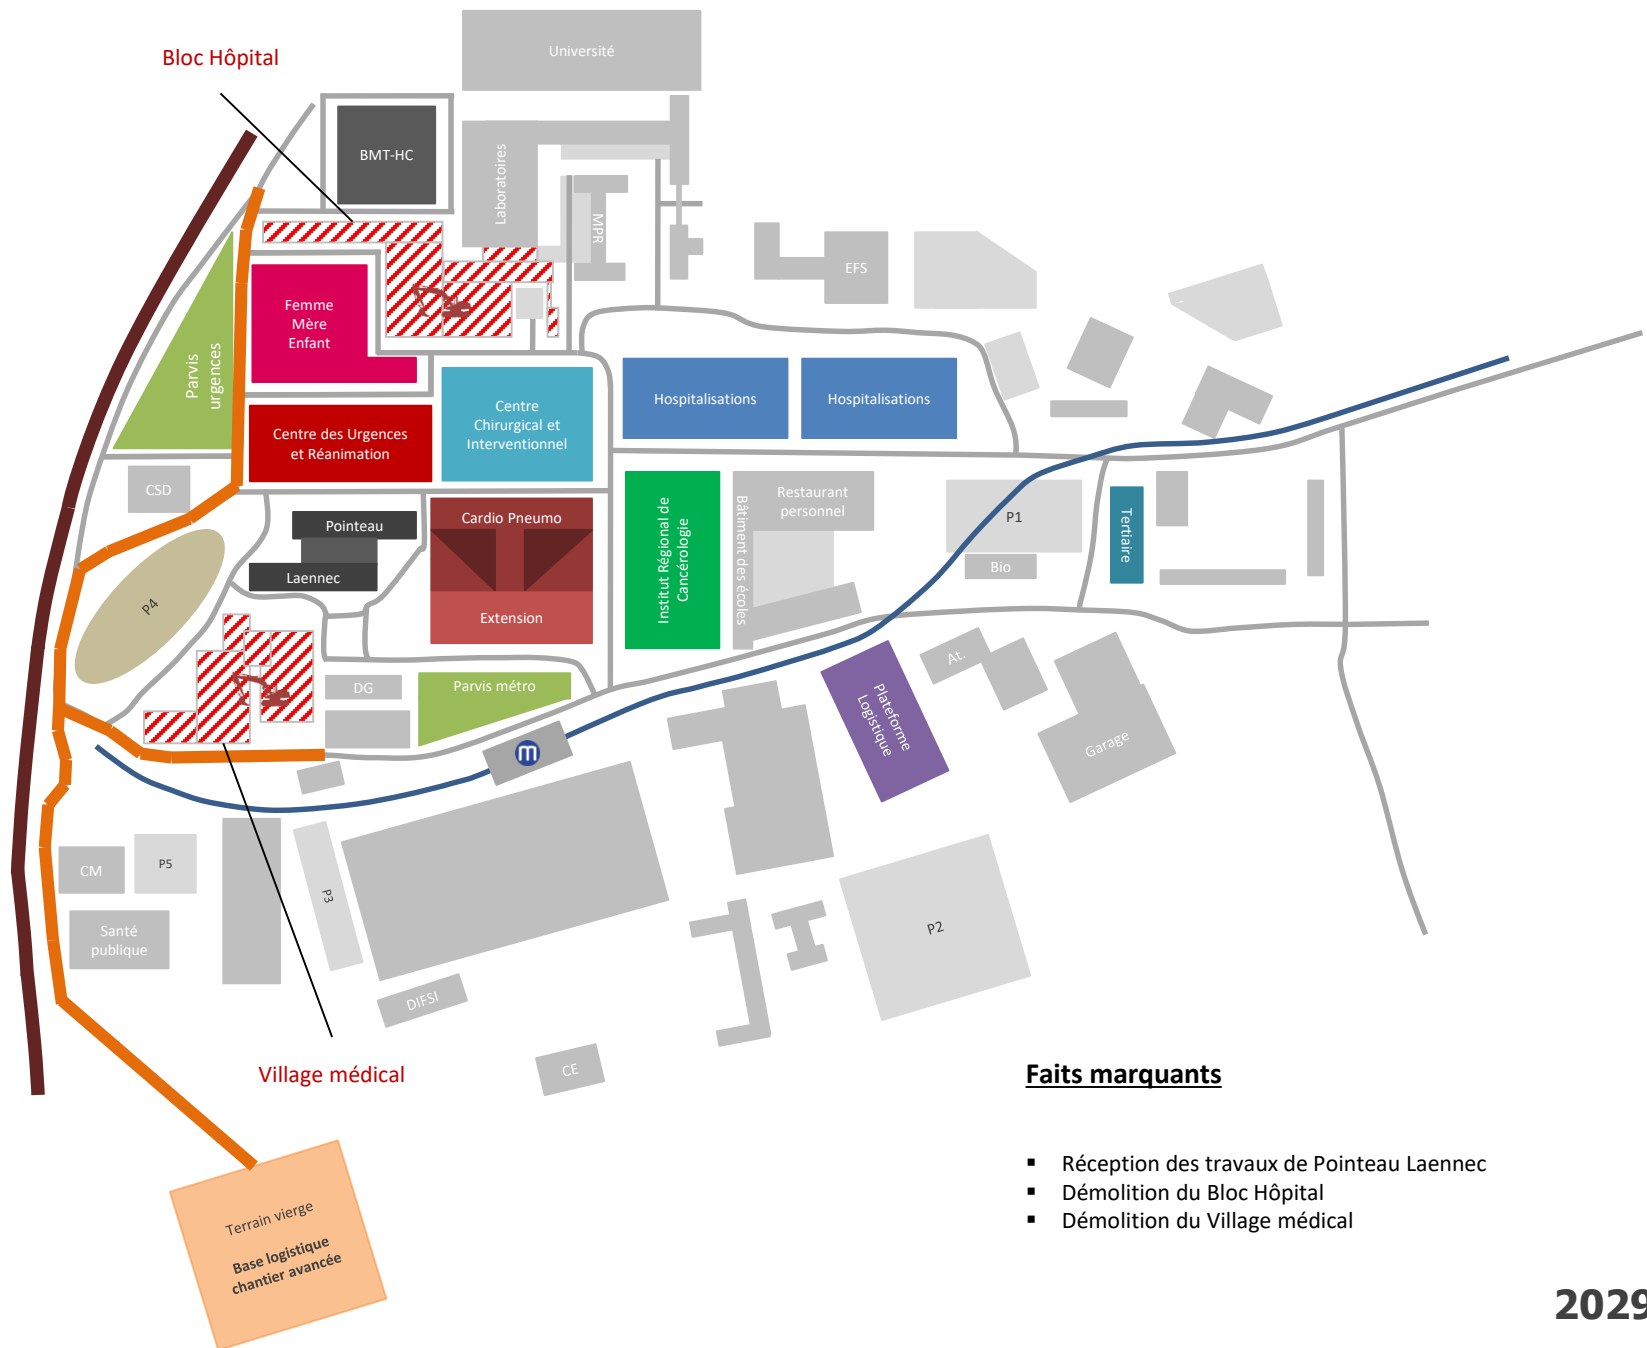


Bloc Hôpital

Village médical

Terrain vierge
Base logistique
chantier avancée

Faits marquants

- Réception des travaux de Pointeau Laennec
- Démolition du Bloc Hôpital
- Démolition du Village médical

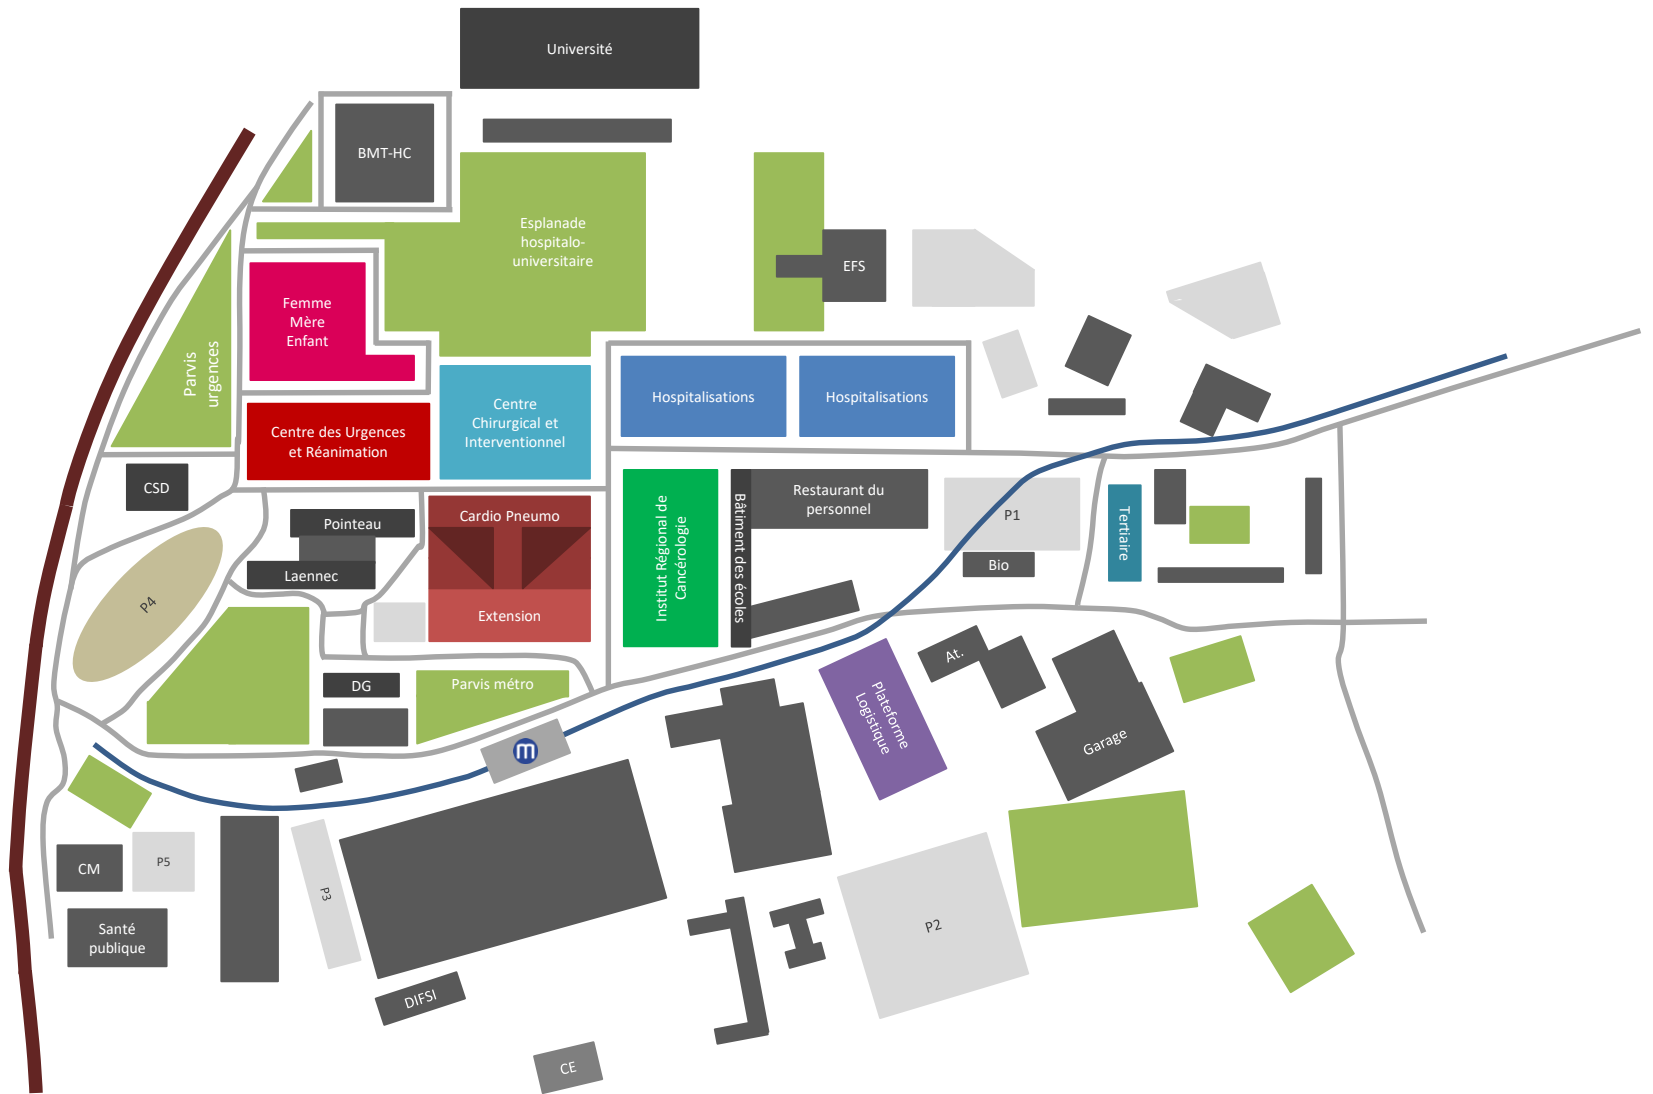

Centre Hospitalier Universitaire de Rennes
Site de Pontchaillou 2029
